EKSEMPEL BYGG AS

Eksempel Bygg AS



Vernerunde

DEMO-101 - Eksempelprosjekt - Soltun

21.10.2026

R01

DEMO-101 - Eksempelprosjekt - Soltun

Vernerunde 1

Områder og etasjer	Ansvarlig for runden	Dato og klokkeslett
Bygg A – 1. etasje Bygg A – 2. etasje	Anna Eksempel	21.10.2026 10:00

RESULTAT

Gjennomført med avvik

1 Avvik · 3 OK · 4/4 kontrollert

Deltakere (3)

Rolle	Navn / virksomhet	Kontakt	Oppmøte
Rundeleder	Anna Eksempel Eksempel Bygg AS		Møtt
Verneombud	Jonas Eksempel Eksempel Bygg AS		Møtt
Elektro	Mina Eksempel Eksempel Elektro AS		Ikke møtt

Oversikt per område

Områder og etasjer	kontrollert	OK	Avvik	Ikke relevant
Bygg A – 1. etasje	2/2	1	1	0
Bygg A – 2. etasje	2/2	2	0	0
Sum	4/4	3	1	0

Kontrollgrunnlag: Byggeplass - kompakt

Avvik og oppfølging

1.1 Er gangveier og adkomst fri?

Avvik 1 · Åpent

PUNKT / BESKRIVELSE

PLASSERING (VALGFRITT)
Bygg A - 1. etasje

ANSVARLIG FAG
Elektro

BESKRIVELSE
Løs kabel krysser gangveien i 1. etasje.

TILTAK
Legg kabelen utenfor gangsonen og sikre fri passasje.

ANSVARLIG PART
Eksempel Elektro AS

UTBEDRINGSFRIST
28.10.2026

PRIORITET
Normal

MARKERING
1 · A-101 - Bygg A - 1. etasje · R01 · Side 1

BILDER TIL PUNKTET




Sjekkpunkt 1.1 · Bilder av avviket · 1

Sjekkliste

Områder og etasjer	Sjekkpunkt	Resultat
Bygg A – 1. etasje	1.1 Er gangveier og adkomst fri?	Avvik 1
Bygg A – 1. etasje	1.2 Er belysningen tilstrekkelig?	OK
Bygg A – 2. etasje	2.1 Er verktøy og materialer lagret ryddig?	OK
Bygg A – 2. etasje	2.2 Er rømningsveier tilgjengelige?	OK

A-101 - Bygg A - 1. etasje · R01 · Side 1 · Markering: 1

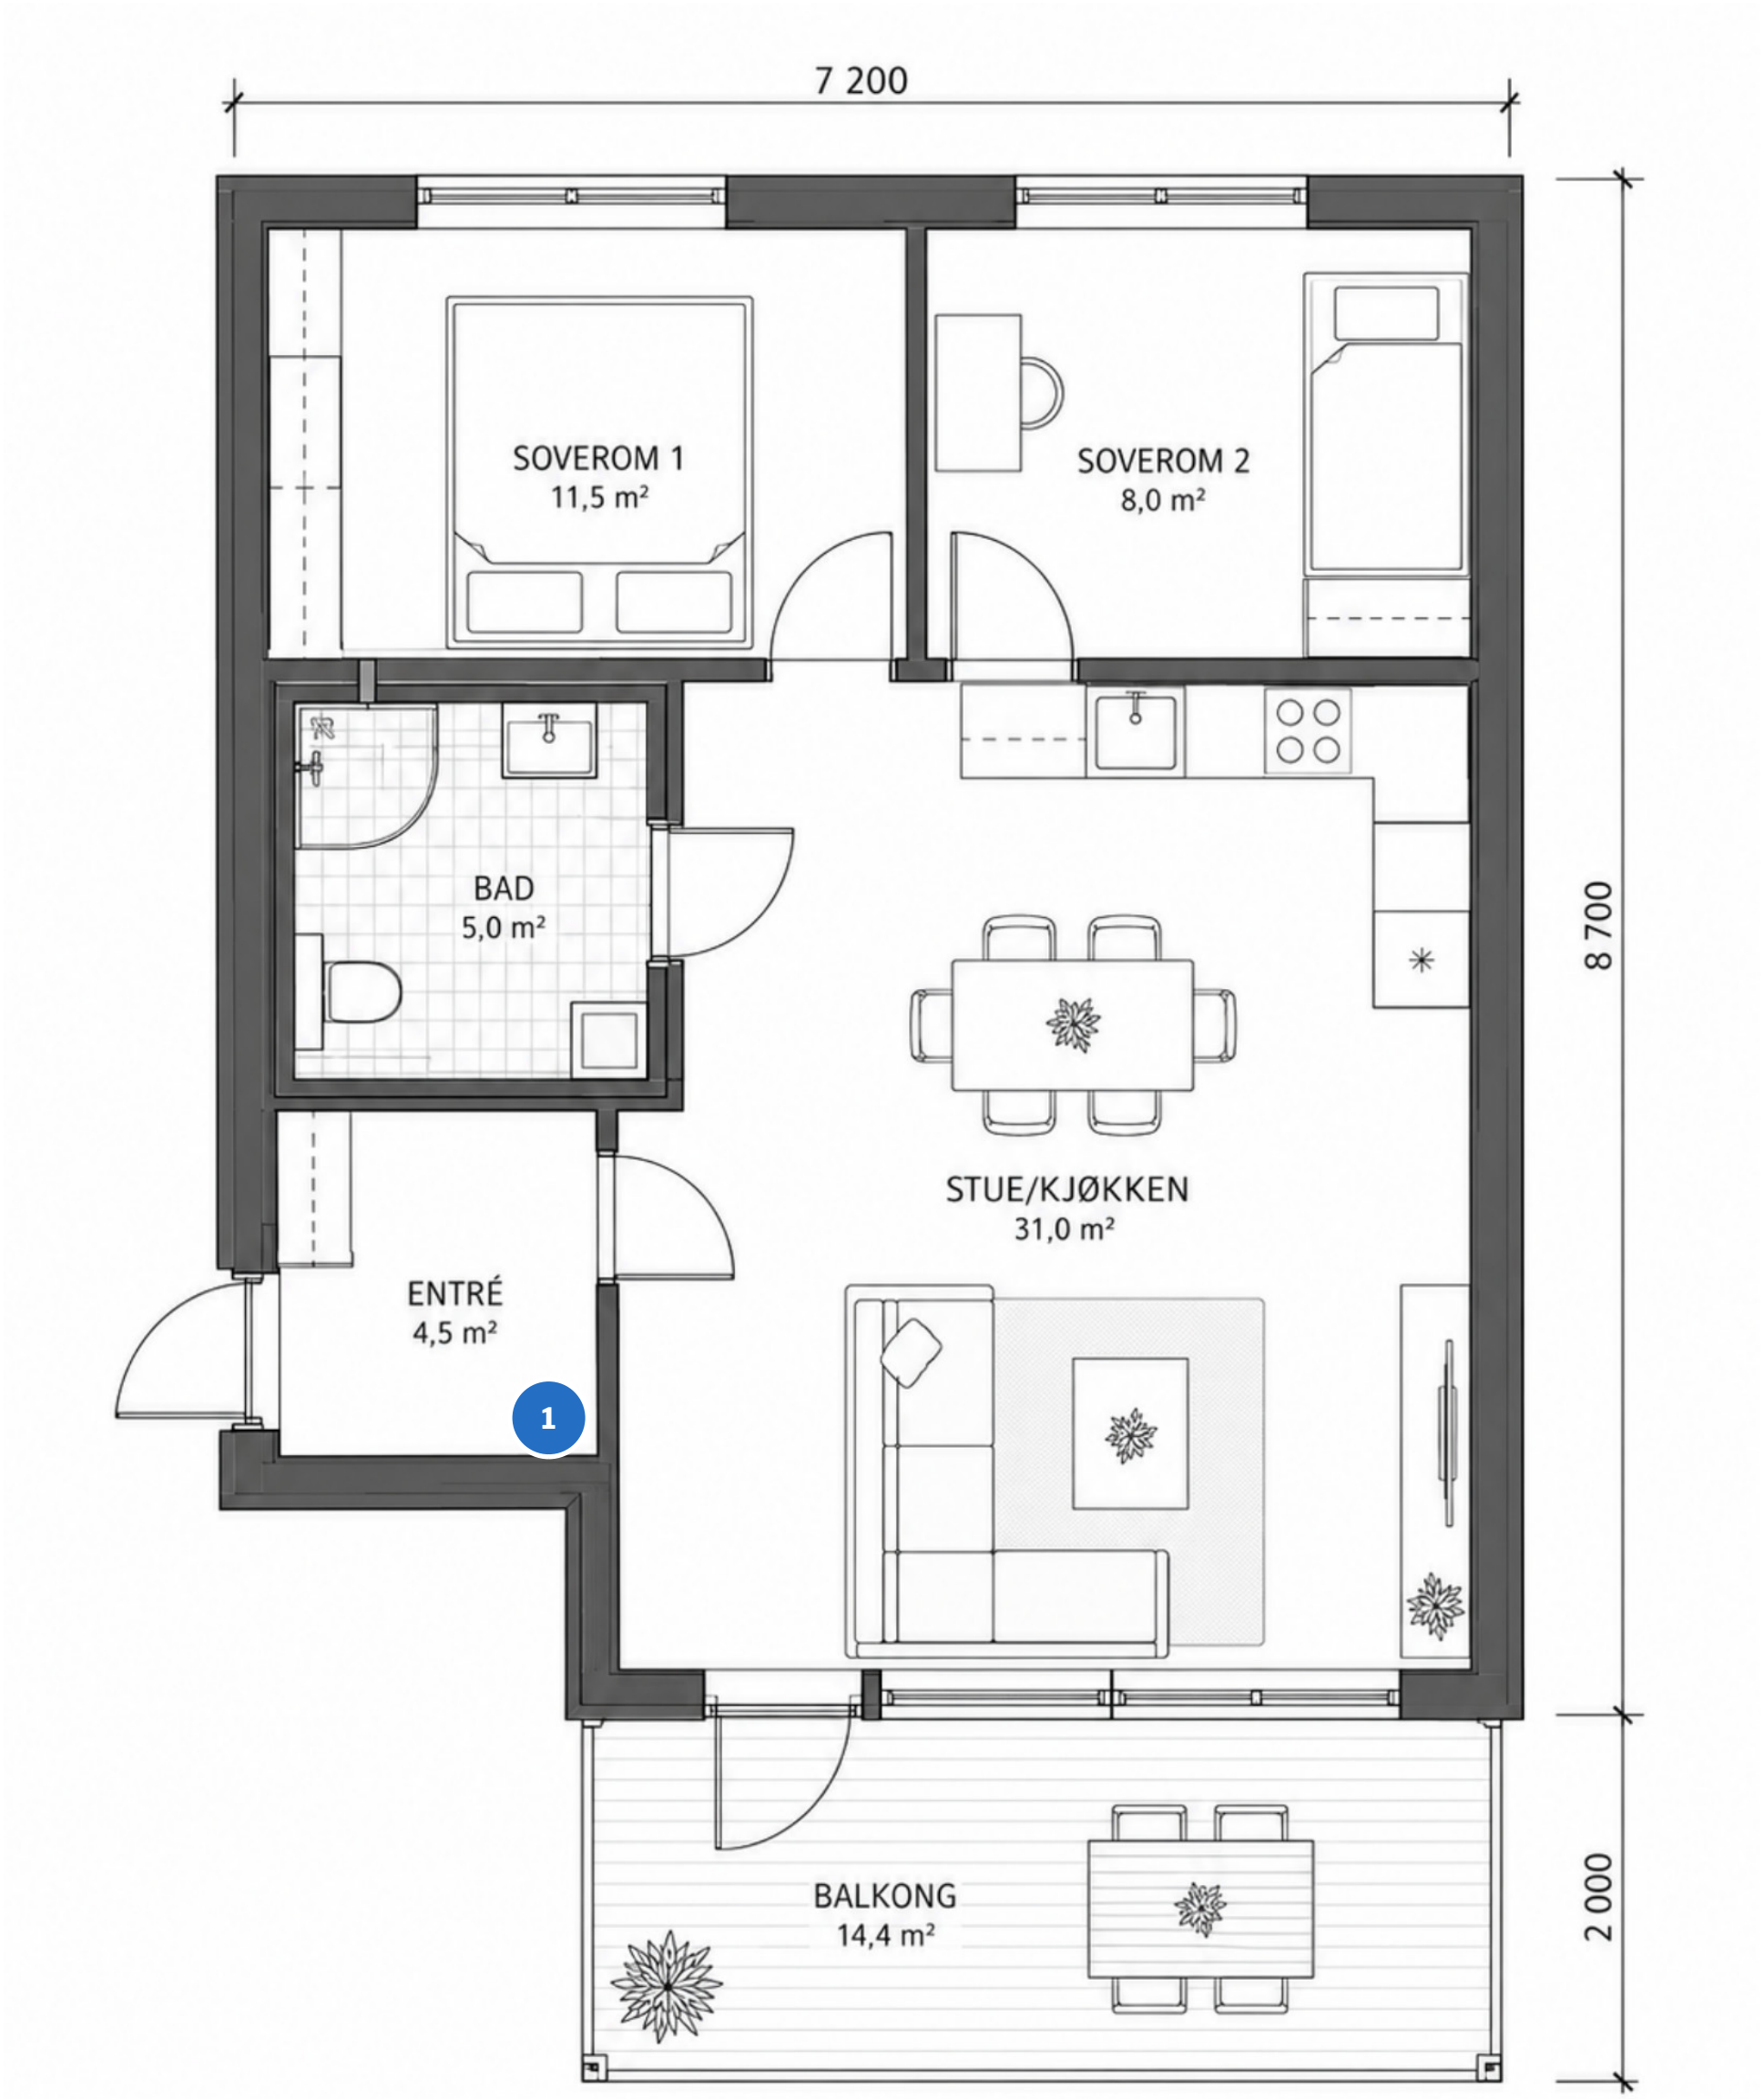

SOLTUN - EKSEMPELTEGNING	A-101	Leilighet 101	21.10.2026	R01
